

TOP 2: Bericht der VGN GmbH – Geschäftsbereich Planung



S1 Fürth – Erlangen: Anbindung „Fürther Bogen“



DB NETZE

- Die Planfeststellung liegt sein Mai 2020 vor. Baubeginn der Hauptbauleistung ist unmittelbar daran erfolgt.
- Der neue Bahnsteig Fürth-Klinikum (Fürth-Unterfarrnbach) soll ab dem 15.04.2022 anfahrbar sein. Ab diesem Zeitpunkt sind theoretisch drei S-Bahnen pro Stunde und Richtung im Stolpertakt möglich.
- Der neu gebaute Mittelbahnsteig Erlangen-Eltersdorf soll ebenfalls ab 15.04.2022 anfahrbar sein.
- Offen sind die noch abzusichernden Fahrzeiten durch DB Netz. Hier ist eine Abstimmung zwischen StMB, BEG und DB Netz notwendig.


S1 Fürth – Erlangen: Anbindung „Fürther Bogen“



 NETZE

- Auf Grund von Baustellen im 2. Halbjahr 2022 ist der 20-Min.-Stolpertakt nur eingeschränkt vom 12.06. – 29.06. und 13.09 – 16.10. fahrbar.
- 29.06. – 12.09.: Baustelle Pegnitztal mit Umleiterverkehr RE über linke Pegnitzstrecke und Ausfall des Laufer S-Bahn-Taktes. Ein Pendelzugbetrieb N – ER scheitert an fehlenden Bahnsteigkanten in Nürnberg Hbf. (die RE-Züge der linken Pegnitzstrecke müssen an den Bahnsteigen 2 und 3 halten).
- 17.10. – 12.12.: Baumaßnahme WÜ – AN mit zusätzlichem Umleiterverkehr BA – N für Fern- und Güterverkehr mit notwendigen Ausfällen.
- Empfehlung DB Regio und BEG: 20-Minuten-Takt nach Erlangen erst ab Dezember 2022 stabil anbieten. Dem haben wir zugestimmt.

S1 Fürth – Erlangen: Geschwindigkeitserhöhende Maßnahmen

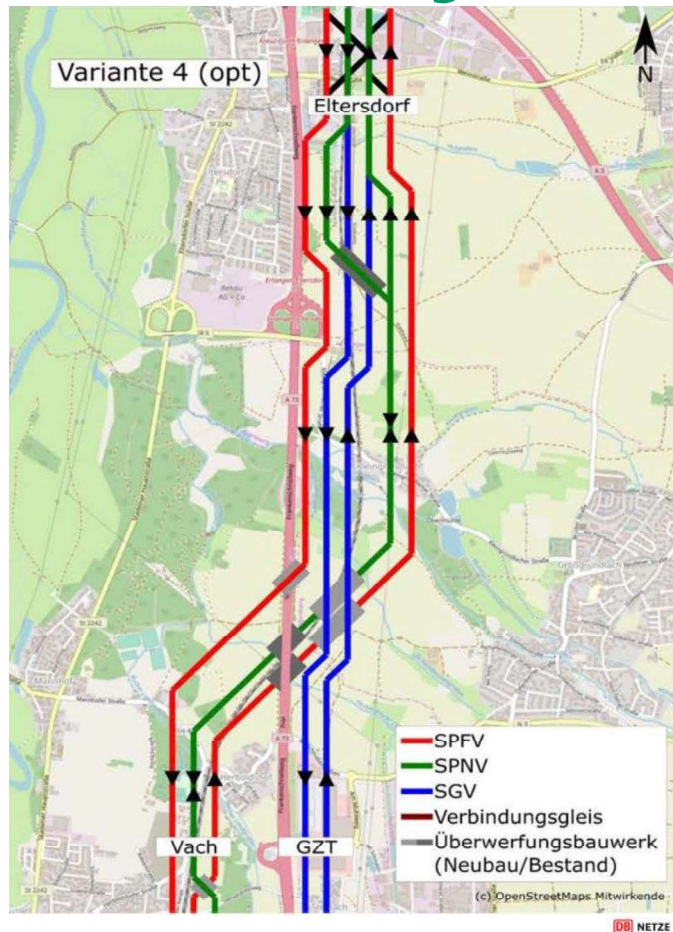


- DB Netz hat die Studie zur Geschwindigkeitserhöhung im Fernverkehr zwischen München und Berlin im Dezember 2020 fertig gestellt.
- Vorschlag der Streckenoptimierung als Bündelungslösung mit S-Bahn wurde als technisch umsetzbar bestätigt.
- Wie man in der Grafik erkennen kann, steht in der Vorzugsvariante für die S-Bahn zwischen Fürth-Unterfarnbach und Eltersdorf nur ein Gleis zur Verfügung. D. h. Verspätungen können hier nicht abgebaut werden.
- Durch die Aufnahme der „Maßnahmen zur zusätzlichen Fahrzeitverkürzung Nürnberg – Erfurt“ in den vordringlichen Bedarf des BVWP ergeben sich für den S-Bahn-Ausbau neue Rahmenbedingungen.
- Die Ergebnisse der Planungen zur zusätzlichen Fahrzeitverkürzung müssen in die vom Gericht geforderte Mängelbehebung für den S-Bahn-Anteil einfließen.

S1 Fürth – Erlangen: Geschwindigkeitserhöhende Maßnahmen



- Ziel ist (vorbehaltlich der Finanzierung) ein gemeinsamer Planfeststellungsbeschluss für den Fernverkehr und die S-Bahn. Ein konkreter Zeitplan wurde jedoch nicht kommuniziert.

S1 Fürth – Erlangen: Güterzugtunnel

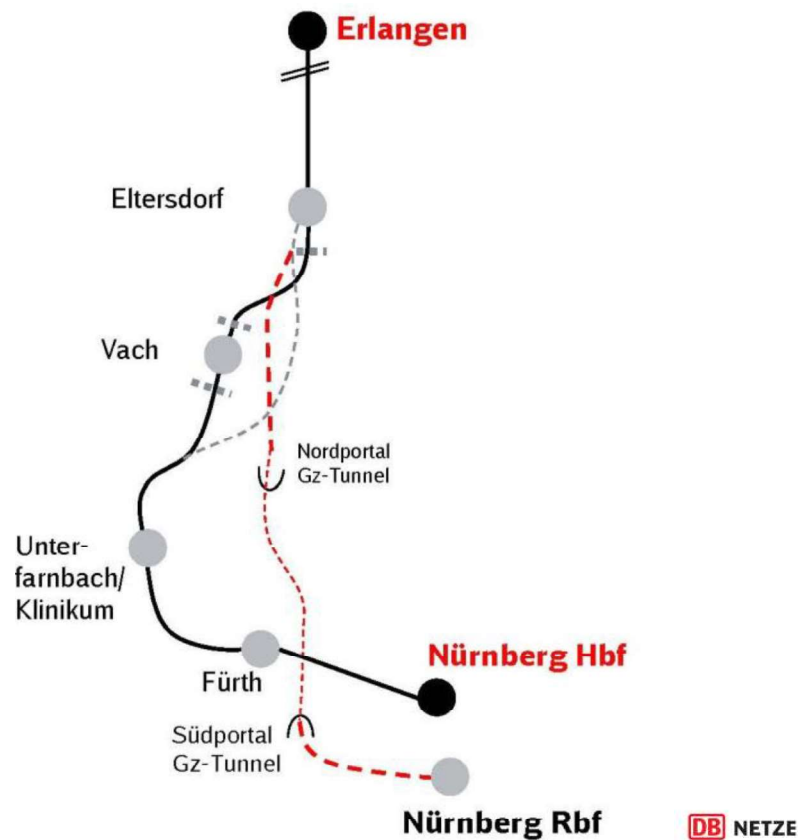

- Für den Güterzugtunnel Fürth ist der 4. Planänderungsantrag im Januar 2021 beim EBA eingegangen.
- Der Nachweis der Wirtschaftlichkeit ($NKI = 1,06$) erfolgte unter Berücksichtigung der vorgestellten geschwindigkeitserhöhenden Maßnahmen.
- Baurecht wird bereits für Dezember 2021 erwartet.
- Die Inbetriebnahme ist für Ende 2029 geplant.

TOP 2: Bericht der VGN GmbH – Geschäftsbereich Planung

BahnhofskonzeptPlus des BMVI



Das **Bahnhofskonzept Plus** besteht aus mehreren Investitionsschwerpunkten:

1. **Barrierefreier Umbau 111 kleinerer Bahnhöfe** (< 1.000 Fahrgäste/Tag)
Sie bekommen u. a. Rampen oder Aufzüge, bessere Wegeführungen, Markierungen und Informationen für die Reisenden
2. **Barrierefreier Umbau von rund 50 mittelgroßen Bahnhöfen**
3. **Modernisierung von 40 kleinen und mittleren Empfangsgebäuden**
Die Stationen erhalten u. a. neugestaltete Wartebereiche, energetisch erneuerte Dächer und Fassaden inkl. Brandschutz oder weitreichende Barrierefreiheit
4. **Sofortprogramm für rund 1.000 attraktive Bahnhöfe zur Unterstützung mittlerer regionaler Handwerksbetriebe**
5. **Ersatz- und Instandhaltungsmaßnahmen der DB AG im Rahmen der LuV III.**

Investitionsvolumen: mehr als 5 Mrd. Euro in mehr als 3.000 Bahnhöfen

1. Bad Staffelstein
Bad Windsheim
Iphofen
Kirchenlaibach
Neustadt (Aisch)
Rückersdorf
Siegersdorf
Zirndorf
3. Bamberg
Erlangen
